Trabajo PGSI

Planificación de un proyecto informático

Ejercicio. Planificación de SISESA

ACLARACIONES

1. El proyecto SISESA aparecerá en la primera fila como tarea con número 0 en la columna EDT. Para ello hay que:
   - Seleccionar: Herramientas y Opciones y pestaña Vista
   - Pinchar en la opción: Mostrar tarea de resumen de proyecto.
   - Cambiar el nombre "Proyect1" por "SISESA".

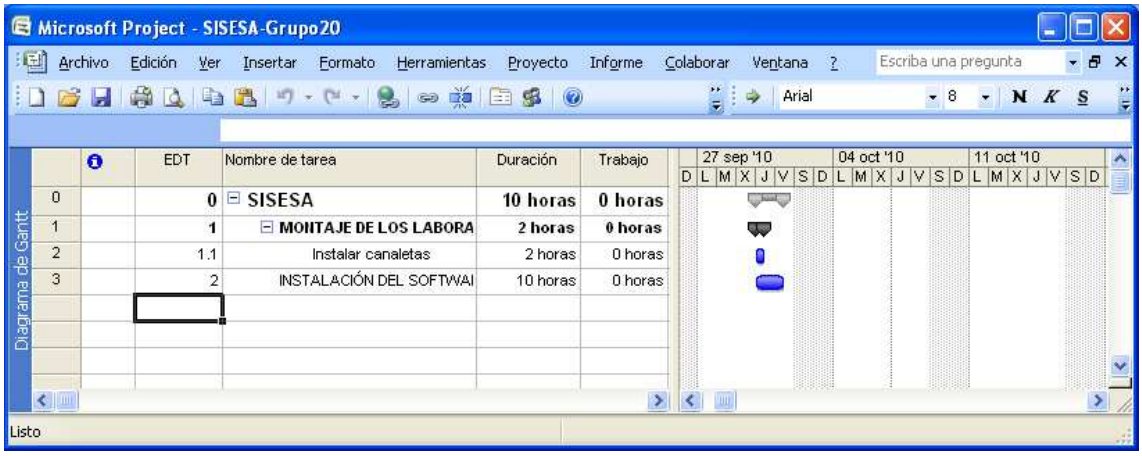

2. En el proyecto SISESA se deben añadir las siguientes columnas: Duración, Trabajo, Trabajo horas extra, Costo Fijo, Costo y Costo horas extra.
3. Tanto la duración como el trabajo deben aparecer en horas para todas las tareas resumen (actividades o fases), las tareas y los hitos, y tanto el coste como el coste por horas extra en euros.
4. Cualquier recurso humano relacionado con los trabajos de SISESA sólo puede trabajar como máximo 2 horas extra por día laborable.
5. En las tareas del montaje de la red van a trabajar tanto el electricista como el técnico especializado en redes.
6. Todas las actividades resumen, las tareas y los hitos deben tener asignado un calendario denominado CalendarioSISESA.

7. Cada recurso humano de SISESA dispone de un portátil, cuyo costo por uso es de 1€ (no es un costo por día, sino por cada tarea del Project). Tanto el recurso humano como su portátil tienen que estar asignados a las tareas que realice dicho recurso humano, pero sólo dentro de tareas que se desarrollen dentro de SISESA.
8. Asimismo, SISESA posee un servidor para llevar a cabo las pruebas de las aplicaciones que necesitan de una BD y de un servidor de Microsoft. El coste por uso es de 2€. El software que como mínimo debe tener el servidor es: SQLSvrStd 2008R2 SNGL MVL y WinWebSvr 2008R2 SNGL. Las tareas a las que se debe asignar el servidor son las que propiamente haga falta su uso.
9. La superfase 5 (PRUEBA GLOBAL DEL SISTEMA) se desarrolla enteramente en las instalaciones del edificio “E-formación”.
10. La amortización del hardware y del software de SISESA será incluido en el Presupuesto, uno para la superfase 3 y otro para la superfase 4.
